



0

Instructions:


En respectant la maquette graphique envoyée par le formateur, reproduire celle-ci en code HTML et CSS.

Répartition du travail:

A la vue du projet ayant démarré de façon plus tardive que ce qui avait été prévu pour cette exercice à l'origine et étant deux dans l'équipe, nous avons décidé de nous répartir les tâches par ordre de priorité. Il s'agissait de définir deux catégories:

- Priorité forte: nous avons placé le header, la page d'accueil ainsi que le footer dans cette catégorie.
- **Priorité faible:** les premiers éléments de cette seconde partie, à savoir la page "Team Chefs", et la page "Toasts" reprennent très simplement des éléments de page Home. Les deux autres pages "Contacts" et





0

I: Préparation de la production

I.1: Mise en place du projet

I.1.1: Mise en place du Planning avec Trello

La première chose que nous avons mise en place est la répartition équitable des tâches aux deux membres de l'équipe.


Pour cela, nous avons défini une tâches par page:









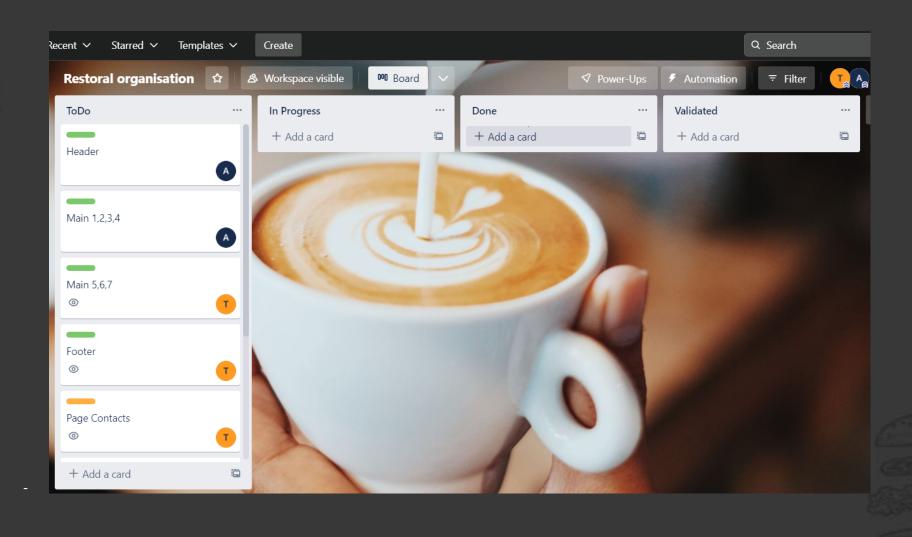



Nous avons également attribué un code couleur selon la priorité de la tâche. Vert pour les tâches prioritaires, orange pour les tâches secondaires.

I.1.2: Mise en place technique:

Les outils de productions définis pour ce projet sont Visual Studio Code et Git.

Aucune complexité identifiée pour le travail en commun sur Visual Studio Code. En ce qui concerne Git, la difficulté hormis son utilisation en tant que débutants, résidait dans la perspective de fusionner nos travaux, quelque peu compliquée à appréhender.

Nous avons donc décidé de merger nos travaux en deux temps. La première fois à l'achèvement de part et d'autre de la page Home et la seconde se ferait à l'achèvement de toutes les pages.


I.2. Enclenchement de la production:

Comme cela figure dans l'illustration ci-dessus, il a été planifié que Arda travaillerait sur la première partie de la page Home et que Adilson en assurerait la seconde partie.







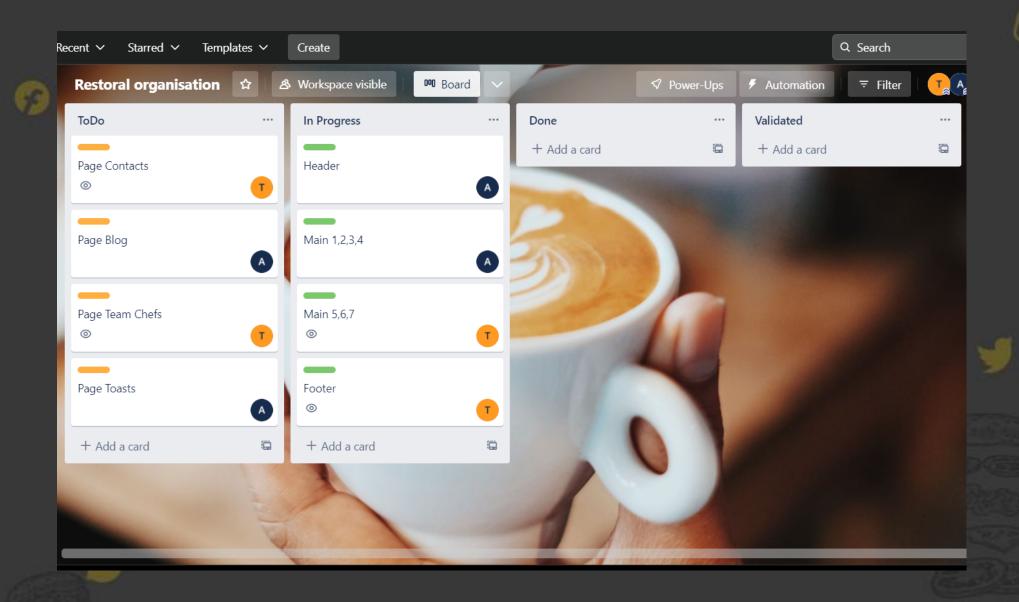



2.: Evolution du projet:





2.1. Parachèvement de la phase 1:


A l'issue de la production de la page d'accueil, nous avons "push" nos travaux sur la branche Main du serveur afin que l'on puisse se mettre chacun à niveau.









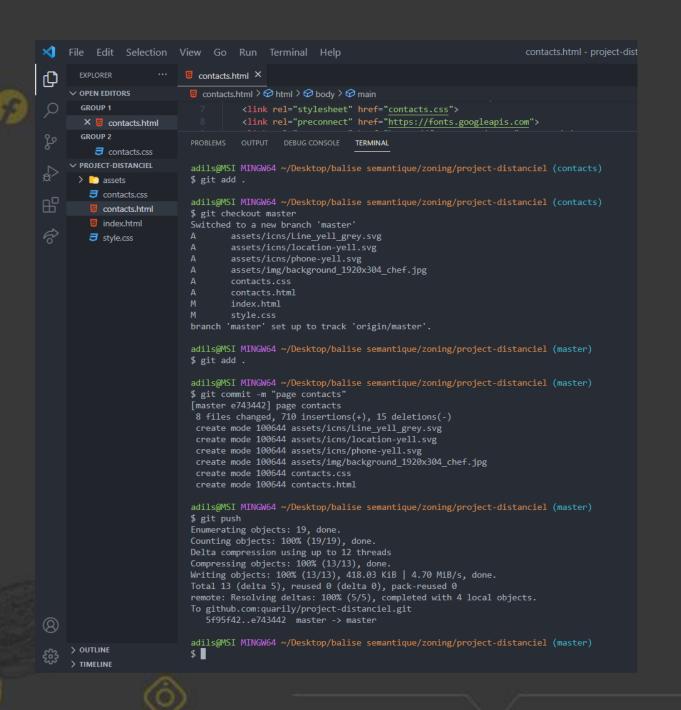







Une fois cela effectué, nous avons mis en commun nos travaux via git depuis le terminal bash dans Visual Studio Code tout en veillant à bien communiquer sur les détails qui feront que le code restera optimiser.


2.2: Enclenchement de la phase 2:

Une fois le travail achevé quant à la phase 1, nous avons pu entreprendre la phase 2 qui correspondait aux autres pages, à savoir les pages "Grid Blog", "Toasts", "Contacts" et "Teams Chefs".







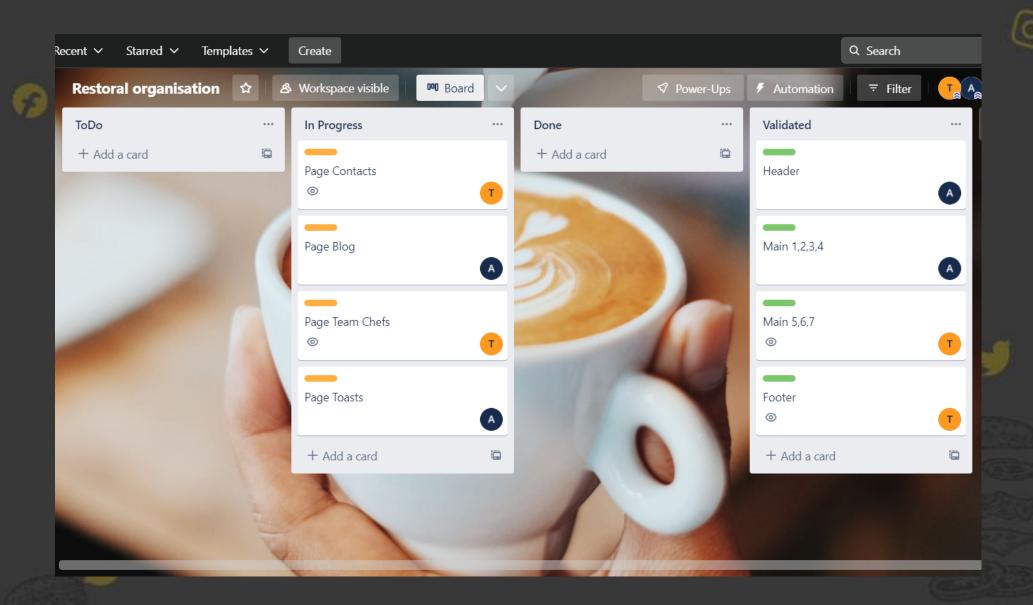



Ces tâches qualifiées de secondaires quant à la perspective globale du projet et quant à notre équipe de deux, devenaient donc envisageables.

2.3. Achèvement de la phase 2:

Comme cela était prévu, la moitié des pages étaient rapides à clôturer. Les pages "Contacts" et "Toasts" ont quant à elles mis plus de temps.

A l'issue de la production de ces deux pages, nous avons mis en commun pour la seconde et dernière fois nos travaux afin que le travail soit accompli.

Merci de votre attention,

Arda et Adilson







